



Brasschaat - Wuustwezel

Aanleggen fietspaden Bredabaan van
Essensesteenweg – Gooreind centrum




- Verwelkoming
- Toelichting ontwerp en fasering door IGEAN
- Toelichting afkoppeling riolering door PIDPA
- Vragen



- Bouwvergunning afgeleverd op 11.01.2018
- Aanbesteding vond plaats op 02.02.2018
- Gunningprocedure is lopende
- Aanvangsdatum werken voorzien 14.05.2018
- Kostprijs 3 706 317,72 euro(incl. btw)

Toelichting ontwerp

Tracé van de werken

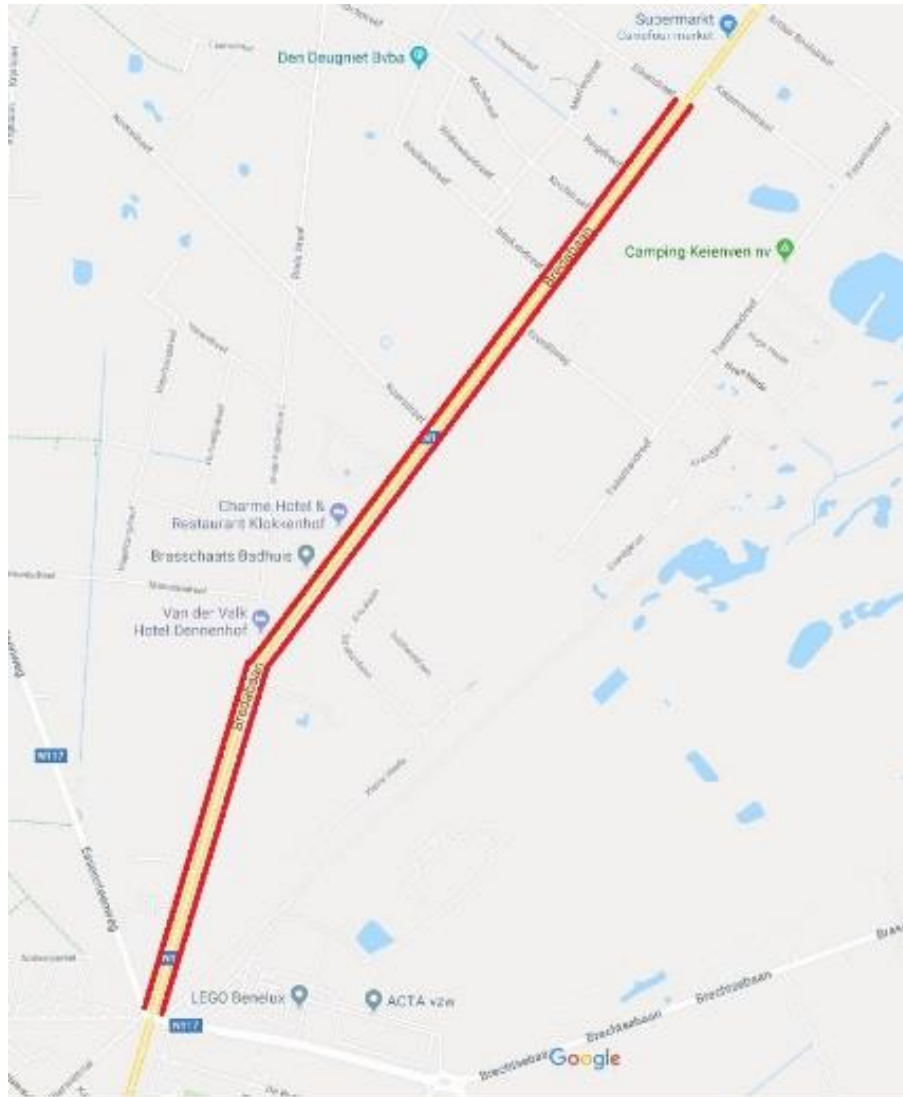

Welke werken worden uitgevoerd

- vrijliggende fietspaden achter grachten
- bestaande rijbaan blijft behouden
- aanleggen van riolering
- aanleggen van parkeerplaatsen aan handelszaken en in Gooreind.
- aanleggen van bushaltes
- gedeeltelijke vernieuwen van de asfaltverharding van de rijbaan
- aanplanten van nieuwe bomen
- aanpassen en vernieuwen van nutsleidingen



Toelichting uitvoering

Fasering – omleidingen - timing

Fasering

Fase 1A: rooien opstanden Gooreind centrum +
doorsteken voor de riolering (en de nutsvoorzieningen)

- duur : van 14 mei tot en met 1 juni 2018.
- omleiding: enkel plaatselijk verkeer, overige langs Autosnelweg

Toelichting uitvoering

Fasering – omleidingen - timing

Fasering

Fase 1B: aanleg tijdelijk fietspad langs oostzijde

- duur : van 14 mei tot en met 15 juni 2018.
- doorgaand verkeer < 3,5ton in beide richtingen mogelijk
- verkeer > 3,5 ton omleiding langs autostrade

Toelichting uitvoering

Fasering – omleidingen - timing

Fasering

- Fase 2: realisatie van de werken langs de westzijde
 - duur : van 6 augustus tot 21 december 2018
 - aanpassen en vernieuwen van de nutsleidingen
 - van 1 januari 2019 tot 5 april 2019
 - aanleggen riolering en fietspad
- doorgaand verkeer < 3,5ton in beide richtingen mogelijk
- verkeer > 3,5 ton omleiding langs autostrade
- fietsers maken gebruik van tijdelijk fietspad

Toelichting uitvoering

Fasering – omleidingen - timing

Fasering

Fase 3: realisatie van de werken langs de oostzijde

- duur : van 22 april 2019 tot 13 september 2019

aanpassen en vernieuwen van de nutsleidingen

van 23 september 2019 tot 14 februari 2020

aanleggen riolering en fietspad

- doorgaand verkeer < 3,5ton in beide richtingen mogelijk
- verkeer > 3,5 ton omleiding langs autostrade
- fietsers maken gebruik van nieuw aangelegde fietspad langs oostzijde en omleiding in Gooreind

Toelichting uitvoering

Fasering – omleidingen - timing

Fasering

Fase 4: afschrappen en asfalteren van de rijweg

- duur : van 1 maart 2020 tot 5 maart 2020
- doorgaand verkeer < 3,5ton in beide richtingen mogelijk
- omleiding: enkel plaatselijk verkeer, overige langs Autosnelweg -
- fietsers maken gebruik van nieuw aangelegde fietspaden

Toelichting

Minder hinder maatregelen

- Aanpalende eigenaars en handelaars blijven bereikbaar
- Toegankelijkheid voor fietsers en voetgangers blijft verzekerd
- Afhaling huisvuil
- Openbaar vervoer
- Onderhoud werfzone
- Handelaars: inkomstencompensatie

www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/rentetoelage-voor-hinder-bij-openbare-werken

Toelichting communicatie

- Website
www.brasschaat.be
www.wuustwezel.be
- Centraal meldingspunt
planologie@brasschaat.be
- Digitale nieuwsbrief
communicatie@brasschaat.be

Toelichting riolering en afkoppeling



VRAGEN

